



Registre n°: 16664 Scellén°: 49270
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: 30, rue de Flege
5377 Somme Leuze
 PROPRIETAIRE: M. TRIEHELS
 Adresse: 15, rue des zones
 DEMANDEUR: 6940 Durbuy
 Adresse: "
 INSTALLATEUR: "
 Adresse: "
 TVA ou CI: 590 5895410 67



ACCREDITE
ISO 17020

DISTRIBUTEUR: IDEG Compteur n°: A PLACER Index: —

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Ap: Les mesures utilisées: Mesureur de terre n° SGS: B1205 - Mesureur d'isolement n° SGS: B1205 - Mesureur de continuité n° SGS: B1296
 Sc: La liaison à la terre: T-T-T Procédure technique: (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 902

Da: Le contrôle: g/05/07
 Ty: Le contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RCPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~
~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)~~

Type d'installation: ~~Existante~~ - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier
 Type locaux - compris dans l'installation: ~~habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation~~
~~résidentielle~~ REE DE CHAUFFAGE DROIT APPARTEMENT N°9

Début des travaux: fondation avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - A - Prévus: II 40 A
 Raccordement: Tension: 2 x 230 V AC-DC; Protection raccordement: Existante
 Câble alimentation tableau principal: 4 x 10 mm², type: XUB; Inter. général: DP1240 A, type: A

Type prise de terre: ~~boucle - barres - piquets - conducteur horizontal~~
 Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 8; R_a = 18,52 Ω; R_{i tot} = > 200 M Ω

REMARQUE: Voir schéma en annexe

| Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| I _n (A) | I _{cc} (A) | Δ I _n (mA) |
| <u>II 40</u> | <u>3000</u> | <u>300</u> |
| Circuit | Calibre | Ligne / Utilisateur |
| | <u>GENERAL</u> | |

| Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| I _n (A) | I _{cc} (A) | Δ I _n (mA) |
| <u>II 40</u> | <u>3000</u> | <u>30</u> |
| Circuit | Calibre | Ligne / Utilisateur |
| <u>F</u> | | |
| <u>E</u> | | |
| <u>H</u> | | |

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - ~~salle d'eau - lave-vaisselle - sèche-linge - boiler - salle de douche~~: Oui - Non
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non
- Le coffrage électrique placé: Oui - Non
- La réalisation de l'installation électrique conformément aux schémas: Bon - ~~Infractions - Remarques~~
- Le matériel électrique: Bon - ~~Infractions - Remarques~~
- La protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: Bon - ~~Infractions - Remarques~~
- La continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: Bon - ~~Infractions - Remarques~~
- Matériel électrique fixe et mobile: Bon - ~~Infractions - Remarques~~

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES:

NEANT

REMARQUES DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.
 CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
 L'installation est conforme sous réserve de (voir verso 1). Le DPCDR général est en plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux ~~ou~~ personnes intéressées.
 L'installation est en conforme. Le DPCDR est en plombé (voir verso 2).
 L'installation doit être vérifiée avant le 09/10/2032 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'INSPECTEUR:
 N° + nom + signature
9/05/07
 Les conditions générales de SGS Bureau Nivelles, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

NOM - FONCTION / QUALITE:
 Vu inspecteur à la date et dessus
[Signature]
 Feuille n° 120295


VISA DU DISTRIBUTEUR:
 DATE:

BLEE10.09F-24/01/05

Appartement 4

Contrôlé par - Geconocel Ard docci
 SGS-Bureau N° 123456789
 Date/Catum ... 12/11/07
 Agent 459

9/11/07

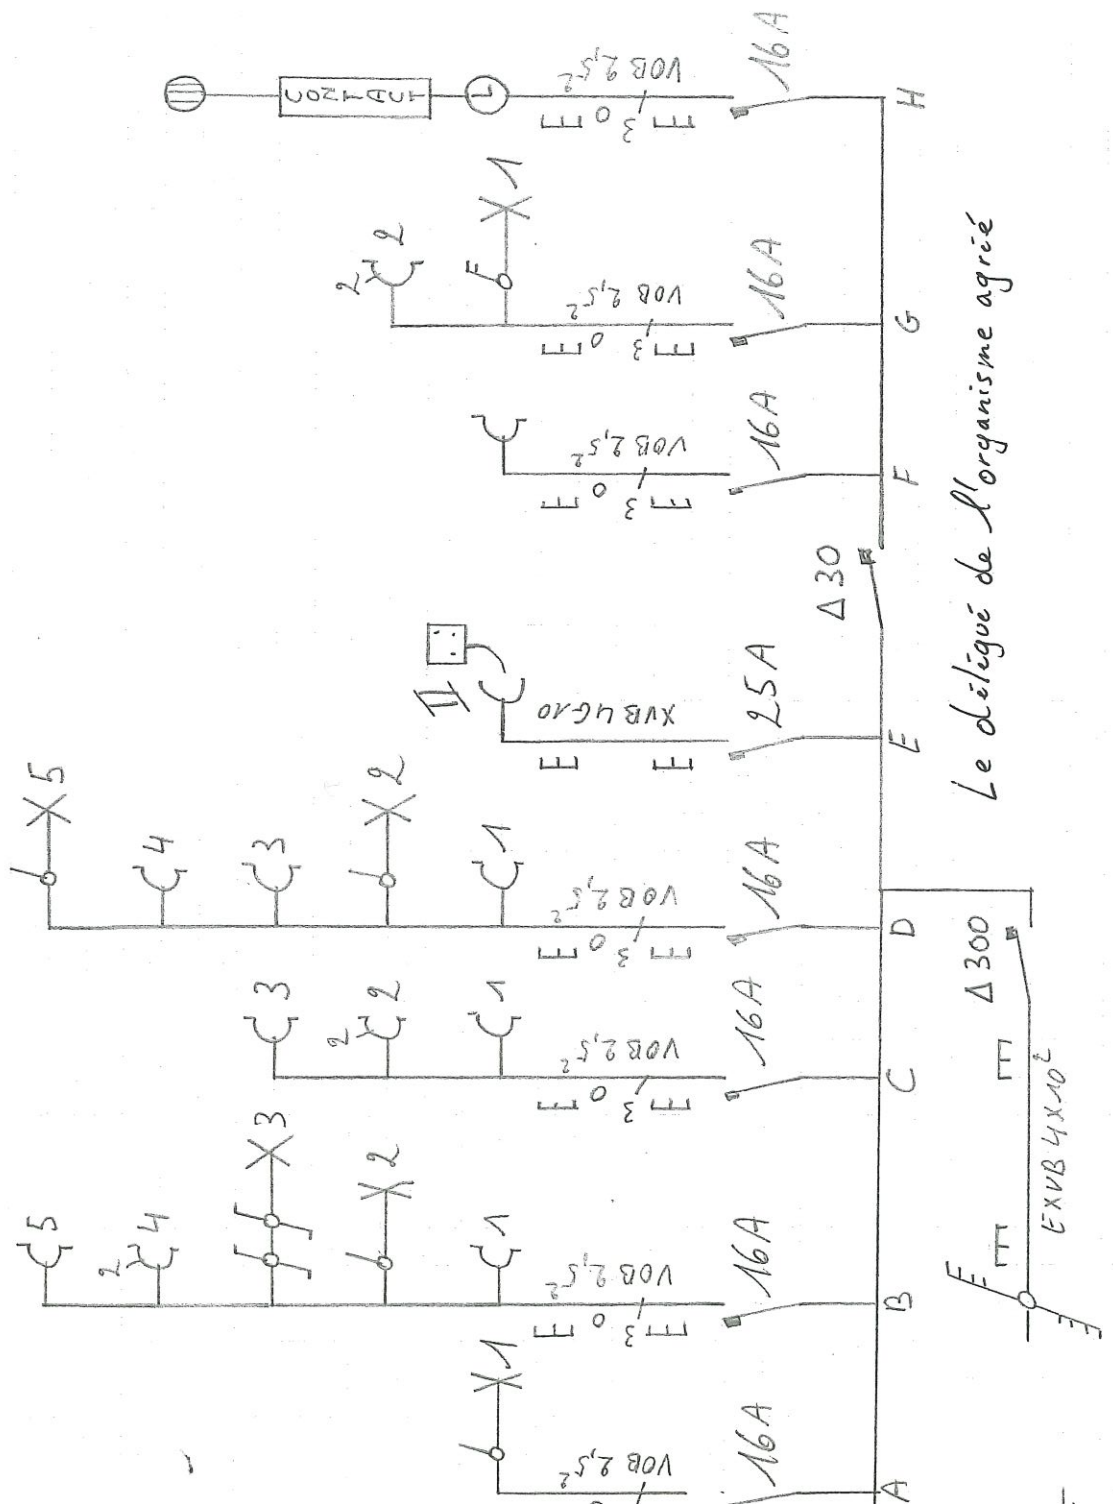

Le délégué de l'organisme agréé

Le responsable
 Trichels Jazchi

Appartement 4

